


가스배관 가용접 작업중 용접불티 등에 의한 화재

공사명	○○터미널 지하층 설비공사	발생일시	2014.05.26(월) 09:02분경
재해형태	화재	재해정도	사망 8명 등
소재지	경기도 고양시 일산동구 백석동	공사규모	터미널 지하층 설비공사
재해개요	2014. 5.26 (월) 09:02분경, 고양시 일산동구 백석동 소재, ○○공무(주) ○○종합터미널 지하1층 설비공사현장에서 가스배관 가용접 작업 중 용접불티 등에 의한 화재로 사망 8명, 중상 5명, 경상 52명 등 65명이 질식 등의 재해가 발생함		

재해상황도

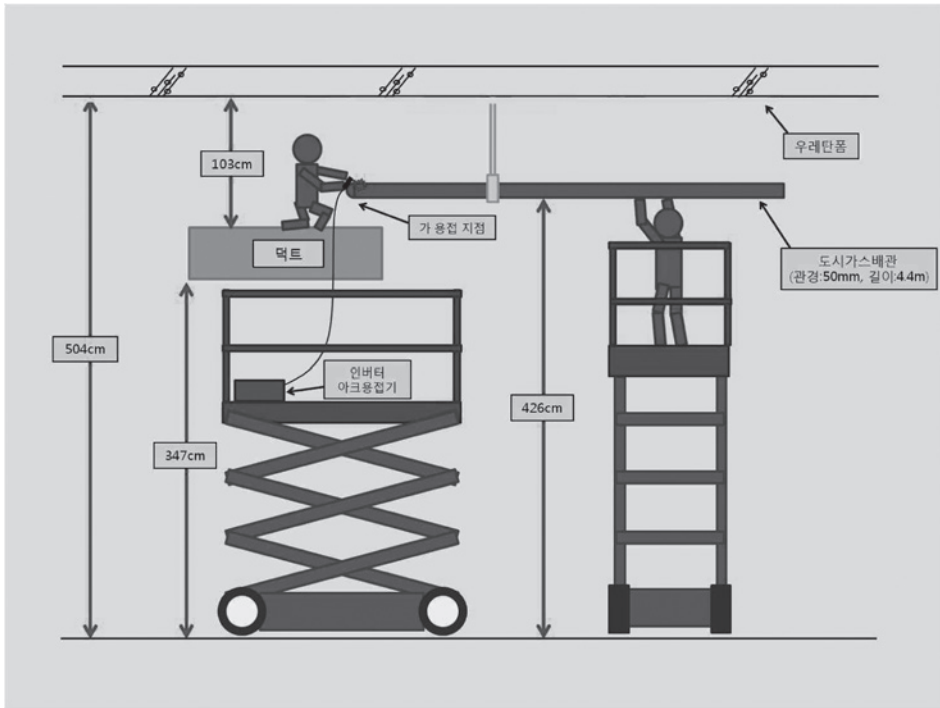

안전대책	<ul style="list-style-type: none"> - 환기가 충분하지 않은 장소에서 가연성 소재의 보온재, 우레탄 폼 등이 근접하고 있어 용접작업 시 방호조치 및 용접불티 비산방지조치(비산방지덮개, 용접방화포 등)를 철저히 하여야 함. - 인입배관을 분리한 상태(맹판 설치)에서 반대측 배관 끝단에서부터 차단밸브 쪽으로 순차적으로 배관 용접작업을 실시하여야 함 - 차단밸브 오조작 방지를 위해 잠금장치 및 Tag(담당자 기재)를 부착하는 등의 조치를 하여야 함
------	---
